



**DE HOOP
PEKSO**

MONTAGE HANDLEIDING

dehoop-pekso.nl



Verwerken van de
**Voorgespannen
kanaalplaatvloeren**



Uw ruwbouw totaalleverancier

Algemeen

In deze verwerkingsvoorschriften zijn alle zaken die betrekking hebben op de verwerking zoals genoemd in de productnorm NEN-EN 1168 en het Erkend BB-aansluitdocument.

De vloerelementen worden aangebracht overeenkomstig het legplan dat door of vanwege de producent is verstrekt, waarbij men dient te controleren of men in het bezit is van de meest recente tekening.

Inspecteer bij aflevering van de kanaalplaten of :

- geleverd is wat is overeengekomen
- het merk en de wijze van merken juist zijn
- de kanaalplaten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke

Reclames dienen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur na aankomst van de vloerplaten schriftelijk bij De Hoop Pekso B.V. worden gemeld.

Transport , Opslag en Hijsen

Handelingen met betrekking tot transport, opslag en hijsen mogen geen aanleiding geven tot beschadiging en/of scheurvorming van de vloerelementen. Het transport van de fabriek naar de bouwplaats wordt verzorgd met zelflossers of schuiftrailers in vrachten van 25 ton of meer. Zorg ervoor dat onze vrachtcombinaties de bouwplaats goed kunnen bereiken. Kanaalplaten 165 mm en 200 mm worden naast de auto gelost, met één man hulp van de afnemer, op een door de afnemer aan te wijzen plaats. Zorg er hierbij voor dat de ondergrond voldoende vlak, horizontaal en voldoende draagkrachtig is. Kanaalplaten 265 mm en 320 mm worden onder uw bouwkraan aangevoerd op verharde wegen, hierbij dienen twee mensen van de afnemer de platen te lossen. De chauffeurs mogen niet helpen bij het lossen. De vloerelementen dienen vrij van de grond te worden gestapeld en onderstept. Er kunnen meerdere elementen van gelijke afmetingen op elkaar gestapeld worden, echter de onderstoppen dienen exact boven elkaar (tussen de vloerelementen onderling) aangebracht te worden. Volg de aanwijzingen van de kleminstructie over het hijsen van de elementen. De veiligheidskettingen onder het element doorhalen en zo strak mogelijk bevestigen. De klemmen zijn aan de evenaar instelbaar op diverse standen. Kies een dusdanige stand dat het maximale overstek van het element buiten de klem niet wordt overschreden. Pasplaten hijsen m.b.v. hijsleutels (hijshoek min. 60°) of met kettingen. Handeling en het gebruik van hulpmiddelen bij het hijsen moeten plaatsvinden overeenkomstig de betreffende voorschriften van De Hoop Pekso B.V.

Technische gegevens

Eigen gewichten bij een standaardplaatbreedte van 1200 mm.


WK 165 mm.: 258 kg/m² WK 265 mm.: 366 kg/m²

WK 200 mm.: 295 kg/m² WK 320 mm.: 436 kg/m²

Toleranties

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------|
| lengte element: | ± 25 mm | hoogte 165 en 200 mm: | ± 10 mm |
| breedte element: | ± 5 mm | hoogte 265 en 320 mm: | ± 15 mm |
| breedte pasplaat: | ± 25 mm | plaats sparing: | ± 25 mm |
| haaksheid plaatkop: | ± 15 mm | afmeting sparing: | ± 10 mm |
| toog/ doorbuiging: | ± 15 mm of (lengte in mm. / 1000 x 1.5); grootste waarde geldt | | |

Op de toleranties is tevens de NEN-EN 13369 van toepassing.

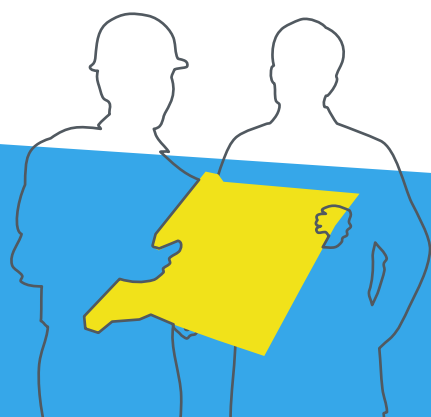

Oplegging

De ontwerp opleglengte is op het legplan aangegeven. De werkelijke opleglengte moet tenminste 2/3 van de ontwerp opleglengte bedragen, doch met een minimum:

- op metselwerk 65 mm.
- op beton 50 mm.
- op profielstaal of voldoende vormvast plaatstaal 45 mm.

De steunpunten ter plaatse van de oplegging van de vloer moeten vlak en strak zijn uitgevoerd of worden afgewerkt. (bijv. specie, bouwvilt of oplegrubber)

Het bovenvlak van een tussensteunpunt mag na afwerking niet meer dan 5 mm. onder een rechte lijn door de eindopleggingen liggen.

Montage

Bij de montage van de vloerelementen dient men de door de opdrachtgever goedgekeurde legplannen van De Hoop Pekso B.V. aan te houden. Hierbij adviseren wij om de plaatnaden en plaatmerken vooraf op de draagconstructie af te tekenen. De op het legplan aangegeven voorzieningen zoals bijv. sparingsen zijn hierbij bepalend voor de juiste plaatsing van een vloerelement. Let hierbij op eventuele boven de constructie uitstekende leidingen. De onderzijde van de kanaalplaten is strak en glad waardoor een minimale afwerking volstaat, echter enkele luchtbellens zijn niet altijd te voorkomen. Bij spuiten of rollen van het plafond is het advies om deze met een vulmassa voor te messen. Pasplaten hebben aan één zijde een ruwe kant die niet is voorzien van een afgeronde zijde. Deze ruwe zijde, snijkant genoemd, dient waar nodig in het werk bijgewerkt te worden. Kanaalplaten vertonen een toeg ten gevolge van de voorspanning. Deze toeg is afhankelijk van de voorspanning, plaatlengte en elementbreedte en is inherent aan het werken met voorgespannen systeemvloeren. Eventueel kunt u opbuigingsverschillen corrigeren, door voor het aanbrengen van de voegvulling, de minst getoogde plaat m.b.v. een stempel op te draaien en een getoogde plaat enigszins te belasten. Bij de toepassing van kanaalplaten als platte daken adviseren wij om de onderstaande scheidingswanden in een U-profiel te plaatsen of een plafondplint toe te passen. Tijdens en na montage en in bouwphase dient u de ontwateringsgaatjes op hun werking te controleren en deze zonodig open te steken, respectievelijk te boren, zodat zich geen water in de kanalen kan ophopen.

Voegvulling

Het dient aan te bevelen om zo snel mogelijk na de montage van de vloeren de voegvulling aan te brengen, dit om vervuiling van de voegen te voorkomen. Eventueel dienen de voegen uitgebezemd te worden of op een andere manier te worden gereinigd. De voegen tussen de vloerelementen dienen volledig te worden gevuld met beton met de volgende eigenschappen.

- Sterkteklasse groter of gelijk aan C12/15
- Grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal maximaal 8 mm resp. 16 mm. bij een voegbreedte \geq 50 mm.
- Grind en zand voldoen aan NEN-EN 12620 en NEN-EN 196; Cement voldoet aan EN 197-1.

De water-cementfactor moet zo worden gekozen, dat de mortel niet tussen de elementen doorlekt.

Bij een lage buitentemperatuur en vorst zijn de maatregelen als genoemd in NEN EN 13670 eveneens van toepassing op de voegvulling. De benodigde voegvulling voor een kanaalplaat is voor de wk 165 ca. 6 liter, wk 200 8 liter, wk 265 10 liter en wk 320 12 liter per m¹. Bij vloerafwerkingen met steenachtige materialen adviseren wij om een krimpnet over de plaatnaden toe te passen, tevens adviseren wij om bij vloerverwarming een minimale afwerklaag van 70 à 80 mm aan te houden.



Sparingen

In het werk mogen alleen sparingen worden aangebracht zoals op de legplannen is aangegeven. Overige sparingen mogen alleen in overleg met het constructiebureau van De Hoop Pekso B.V. in het werk worden geboord. Om breuk tijdens montage of transport te voorkomen kunnen in bepaalde sparingen nog voorspanstrengen met een onderlaag van beton aanwezig zijn. Deze strengen en restbeton mogen in het werk zorgvuldig worden verwijderd. Bij sparingen in geïsoleerde kanaalplaten is wel de beton maar niet de isolatie verwijderd. De benodigde sparing kan zo precies uit de isolatie worden gesneden wat makkelijker is bij het vervolgens aanhelen van de sparing.

Constructieve druklaag

Indien de vloeren worden uitgevoerd als samengestelde plaat volgens 8.2.5 van NEN-EN 1992-1-1, dan moet de constructieve druklaag tenminste 40 mm. dik zijn. Het te storten beton moet gelijkmatig worden aangebracht, zodat een opeenhoping van de betonspecie wordt voorkomen. Het beton van de druklaag moet voldoen aan:

- De voor de betreffende toepassing overeengekomen milieuklasse NEN-EN 206-1.
- Een sterkteklasse van tenminste C 20/25 volgens NEN-EN 206-1.
- Een grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal kleiner dan of gelijk aan 16 mm.

Drukragen dikker dan 50 mm. moeten zijn gewapend met een kruisnet bestaande uit tenminste staven met een kernmiddellijn van 5 mm. en een hart-op-hart afstand van 250 mm. (staalkwaliteit B 500A) of gelijkwaardig.

Opperbelasting in bouwfase

Kanaalplaten zijn na montage en na het uitharden van de voegvullingen direct belastbaar.

Stenen en/of lijmblokken t.b.v de opgaande wanden kunnen gelijkmatig naast de oplegging worden geplaatst, hierbij mag echter de maximale toelaatbare belasting niet worden overschreden.

Ons constructiebureau kan u hierbij adviseren.

Prestatieverklaring / Certificaten

Al onze producten worden geleverd met een CE-markering:

Conformiteitscertificaat in de fabriek (FPC) nummer 0620-CPR-44605/02

en voldoen aan de eigenschappen zoals deze zijn vastgelegd, in de bij de opdracht als bijlage meegestuurde CE-Prestatieverklaring (Declaration of Performance).

Tevens worden onze producten geleverd met de volgende kwaliteitsverklaringen:

- Erkend BB-aansluitdocument; voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit
- KOMO-kwaliteitsverklaring; Certificaat met productkenmerken (niet zijnde de essentiële kenmerken uit de geharmoniseerde productnorm)
- NL-BSB certificaat:K85645;Producten voldoen aan eisen van het Besluit Bodemkwaliteit



Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

0115 61 32 42
info@dehoop-pekso.nl



CO2021-0102

dehoop-pekso.nl
